
Projeto AFIPE WEB

Apresentação de Resultados







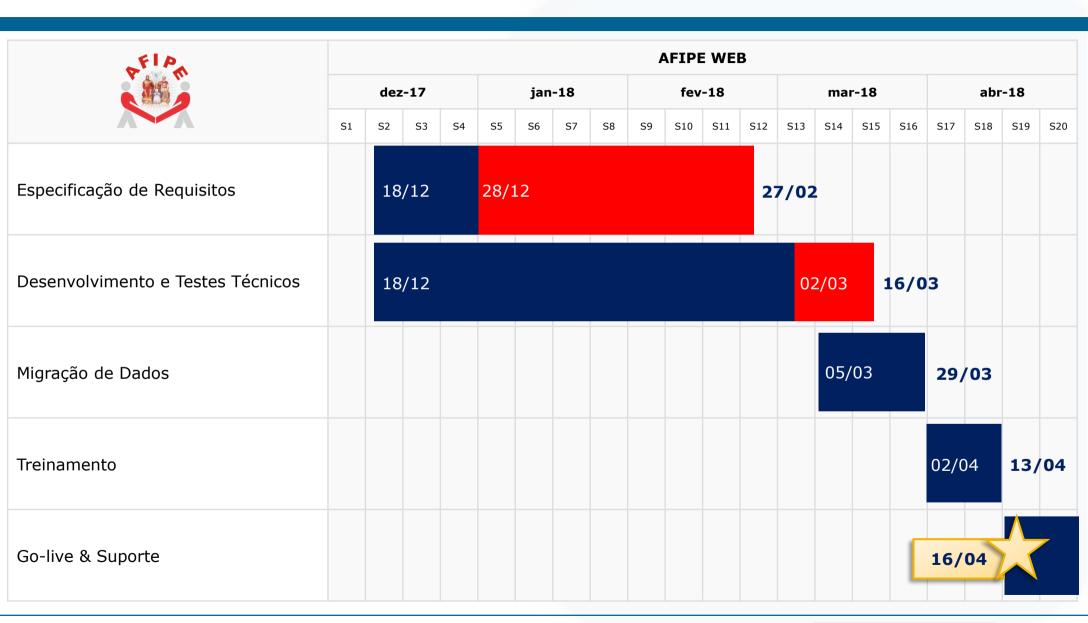










FIA		AFIPE WEB																			
		dez-17			jan-18			fev-18			mar-18			abr-18							
			S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
Especificação de Requisitos													2	7/02	2						
Desenvolvimento e Testes Técnicos			18	/12										0	2/03	1	L6/0	3			
Migração	Plano de Ação									29/03											
Treiname	Força tarefa para homologação dos CDUs entregues pelo desenvolvimento Responsável Fernando Pulcinelli, Ana Flávia e Eduardo Carvalho									02/04 13/04											
Go-live 8	Previsão de entrega 09/03/2018 (sem CDU031 - Remessa) & 23/03/2018 (release candidata)									16/04											



Status:



Planejado: 79% Realizado: 67%

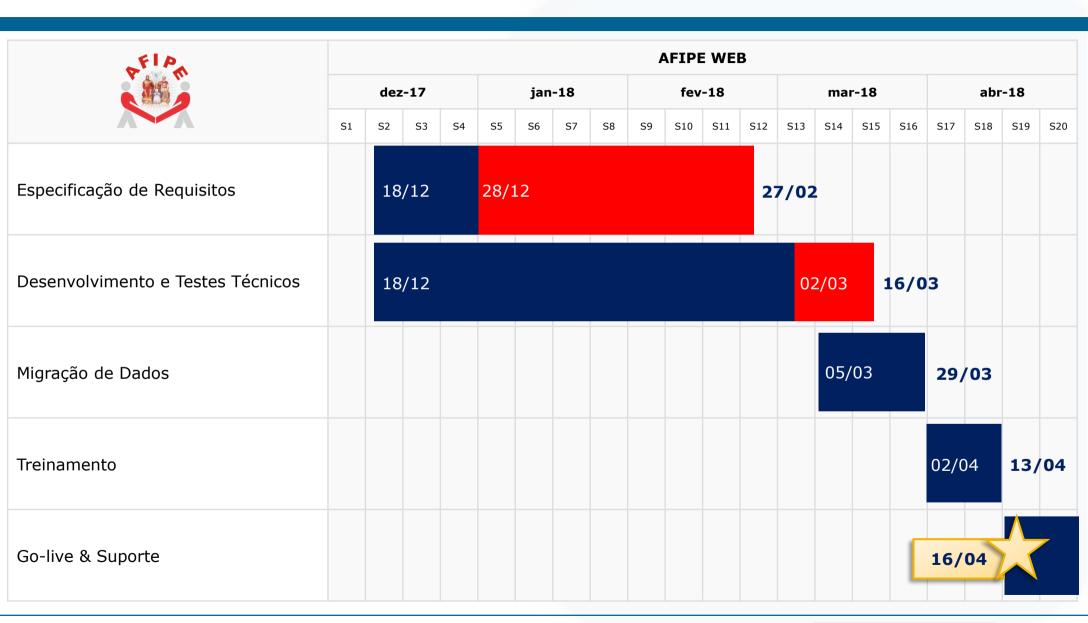







	r	%	%		
Nome da tarefa ▼	jͺ			Início →	Término ▼
△ AFIPE - AFIPE WEB Replanejamento		79%	67%	Seg 15/05/17	Sex 13/04/18
Iníco do Projeto		0%	0%	Seg 15/05/17	Seg 15/05/17
▷ 1ª Etapa do Projeto : Loiseli Santos		0%	0%	Seg 15/05/17	Sex 15/12/17
[M0] Transição de gestores		0%	0%	Sex 15/12/17	Sex 15/12/17
△ 2ª Etapa do Projeto : Ezequiel Bispo		79%	67%	Seg 18/12/17	Sex 13/04/18
Início Replanejamento		0%	0%	Seg 18/12/17	Seg 18/12/17
Etapa 01 - Levantamento e Especificação de Requisitos		100%	98%	Seg 18/12/17	Qui 28/12/17
[M1] Documentação concluída com sucesso		0%	99%	Qui 28/12/17	Qui 28/12/17
△ Etapa 02 - Desenvolvimento		95%	80%	Seg 18/12/17	Sex 02/03/18
▷ Sprint 1		100%	89%	Seg 18/12/17	Sex 12/01/18
[M2] Sprint 1 concluída com sucesso		100%	100%	Sex 12/01/18	Sex 12/01/18
▷ Sprint 2		100%	90%	Sex 12/01/18	Sex 09/02/18
[M3] Sprint 2 concluída com sucesso		100%	100%	Sex 09/02/18	Sex 09/02/18
▷ Sprint 3		54%	0%	Sex 09/02/18	Sex 02/03/18
[M4] Sprint 3 concluída com sucesso		0%	0%	Sex 02/03/18	Sex 02/03/18
[M5] Sistema desenvolvido e homologado		0%	0%	Sex 02/03/18	Sex 02/03/18
▷ Etapa 03 - Migração de Dados		0%	0%	Seg 05/03/18	Qui 29/03/18
[M6] Migração de dados efetuada com sucesso		0%	0%	Qui 29/03/18	Qui 29/03/18
▷ Etapa 04 - Treinamento		0%	0%	Qui 29/03/18	Sex 13/04/18
[M7] Equipe envolvida capacitada com sucesso		0%	0%	Sex 13/04/18	Sex 13/04/18
Término do Projeto		0%	0%	Sex 13/04/18	Sex 13/04/18





▲ Etapa 02 - Desenvolvimento	95%	80%	Seg 18/12/17	Sex 02/03/18
▲ Sprint 1	100%	89%	Seg 18/12/17	Sex 12/01/18
ECDU05 Auditoria de Cadastro	100%	100%	Seg 18/12/17	Sex 29/12/17
▷ ECDU33 Solicitações	100%	100%	Qui 28/12/17	Sex 12/01/18
ECDU11 Contatos	100%	78%	Seg 18/12/17	Sex 12/01/18
ECDU12 Correspondência	100%	100%	Qui 11/01/18	Sex 12/01/18
ECDU09 Colaborador - Aba Diversos	100%	78%	Seg 18/12/17	Sex 22/12/17
ECDU09 Colaborador - Consulta e Cadastro de Solicitações	100%	87%	Qui 21/12/17	Qua 03/01/18
ECDU09 Colaborador - Consulta Correspondência	100%	85%	Ter 02/01/18	Qua 10/01/18
ECDU45 Produtos	100%	100%	Ter 09/01/18	Sex 12/01/18
▶ ECDU47 Solicitação em Massa	100%	100%	Qui 11/01/18	Sex 12/01/18
[M2] Sprint 1 concluída com sucesso	100%	100%	Sex 12/01/18	Sex 12/01/18







▲ Etapa 02 - Desenvolvimento	95%	80%	Seg 18/12/17	Sex 02/0
▷ Sprint 1	100%	89%	Seg 18/12/17	Sex 12/0
[M2] Sprint 1 concluída com sucesso	100%	100%	Sex 12/01/18	Sex 12/0
△ Sprint 2	100%	90%	Sex 12/01/18	Sex 09/0
▷ ECDU33 Solicitações	100%	85%	Seg 15/01/18	Ter 23/0
▷ ECDU13 Devolução Garantida	100%	98%	Seg 22/01/18	Qua 07/0
ECDU12 Correspondência	100%	97%	Sex 12/01/18	Seg 05/0
ECDU31 Remessas	100%	25%	Sex 02/02/18	Sex 09/0
▷ ECDU47 Solicitação em Massa	100%	97%	Sex 12/01/18	Sex 02/0
ECDU42 Triagem de Cadastro	100%	100%	Qui 01/02/18	Ter 06/0
ECDU46 Cadastros Duvidosos	100%	100%	Seg 05/02/18	Qua 07/0
[M3] Sprint 2 concluída com sucesso	100%	100%	Sex 09/02/18	Sex 09/0





				,
				Término ▼
				Sex 13/04/18
				Seg 15/05/17
				Sex 15/12/17
				Sex 15/12/17
				Sex 13/04/18
				Seg 18/12/17
				Qui 28/12/17
▲ Etapa 02 - Desenvolvimento	95%	80%	Seg 18/12/17	Sex 02/03/18
▷ Sprint 1	100%	89%	Seg 18/12/17	Sex 12/01/18
[M2] Sprint 1 concluída com sucesso	100%	100%	Sex 12/01/18	Sex 12/01/18
▷ Sprint 2	100%	90%	Sex 12/01/18	Sex 09/02/18
[M3] Sprint 2 concluída com sucesso	100%	100%	Sex 09/02/18	Sex 09/02/18
✓ Sprint 3	54%	0%	Sex 09/02/18	Sex 02/03/18
ECDU31 Remessas	54%	0%	Sex 09/02/18	Sex 02/03/18
[M4] Sprint 3 concluída com sucesso	0%	0%	Sex 02/03/18	Sex 02/03/18
[M5] Sistema desenvolvido e homologado	0%	0%	Sex 02/03/18	Sex 02/03/18







AFIPE WEB

Status:

Planejado: 79%

Realizado: 67%

Tendência:



Indicadores	S -2	S -1	S	S +1
Preparação do Projeto				
Documentação				
Desenvolvimento				
Homologação				

Comentário

Forca tarefa para homologação do desenvolvimento já concluido.

Atividades CONCLUÍDAS

- ▶ Desenvolvimento ECDU05 Auditoria de Cadastro
- Desenvolvimento ECDU33 Solicitações
- ▶ Desenvolvimento ECDU12 Correspondência
- Desenvolvimento ECDU09 Colaborador
- ▶ Desenvolvimento ECDU13 Devolução Garantida
- ▶ Desenvolvimento ECDU47 Solicitação em Massa

Atividades EM ANDAMENTO

- ▶ Aprovação dos requisitos do CDU31 Remessas
- Desenvolvimento do CDU11 Contatos
- ▶ Desenvolvimento da API de integração com o site

Próximas atividades

- ▶ Testes ECDU05, ECDU33, ECDU12, ECDU09, ECDU13, ECDU47
- ▶ Elaborar Plano de Capacitação e Cutover

Atividades EM ATRASO

- ▶ Aprovação do CDU31 Remessas
- Desenvolvimento do CDU11 Contatos
- ▶ Desenvolvimento da API de integração com o site
- ▶ Testes ECDU05, ECDU33, ECDU12, ECDU09, ECDU13, ECDU47



AFIPE WEB

http://sta-clara/afipeweb



DUVIDAS E SUGESTÕES

Agradecemos sua participação.

